

# PROGETTO di FATTIBILITA' TECNICA ed ECONOMICA



COMUNE di  
**L**UINO  
PROVINCIA di **V**ARESE

“Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati”

## PROGRAMMA **L**AVORI


Febbraio 2018

Il Professionista  
Ing. Stefano Caligara

Studio **T**ecnico di **P**rogettazione **S**tefano **C**aligara  
*Ingegnere*

Via Postcastello, 7 | 21013 | GALLARATE (VA)  
Telefono/Fax: 0331.780589 | E-mail: info@stefanocaligara.it



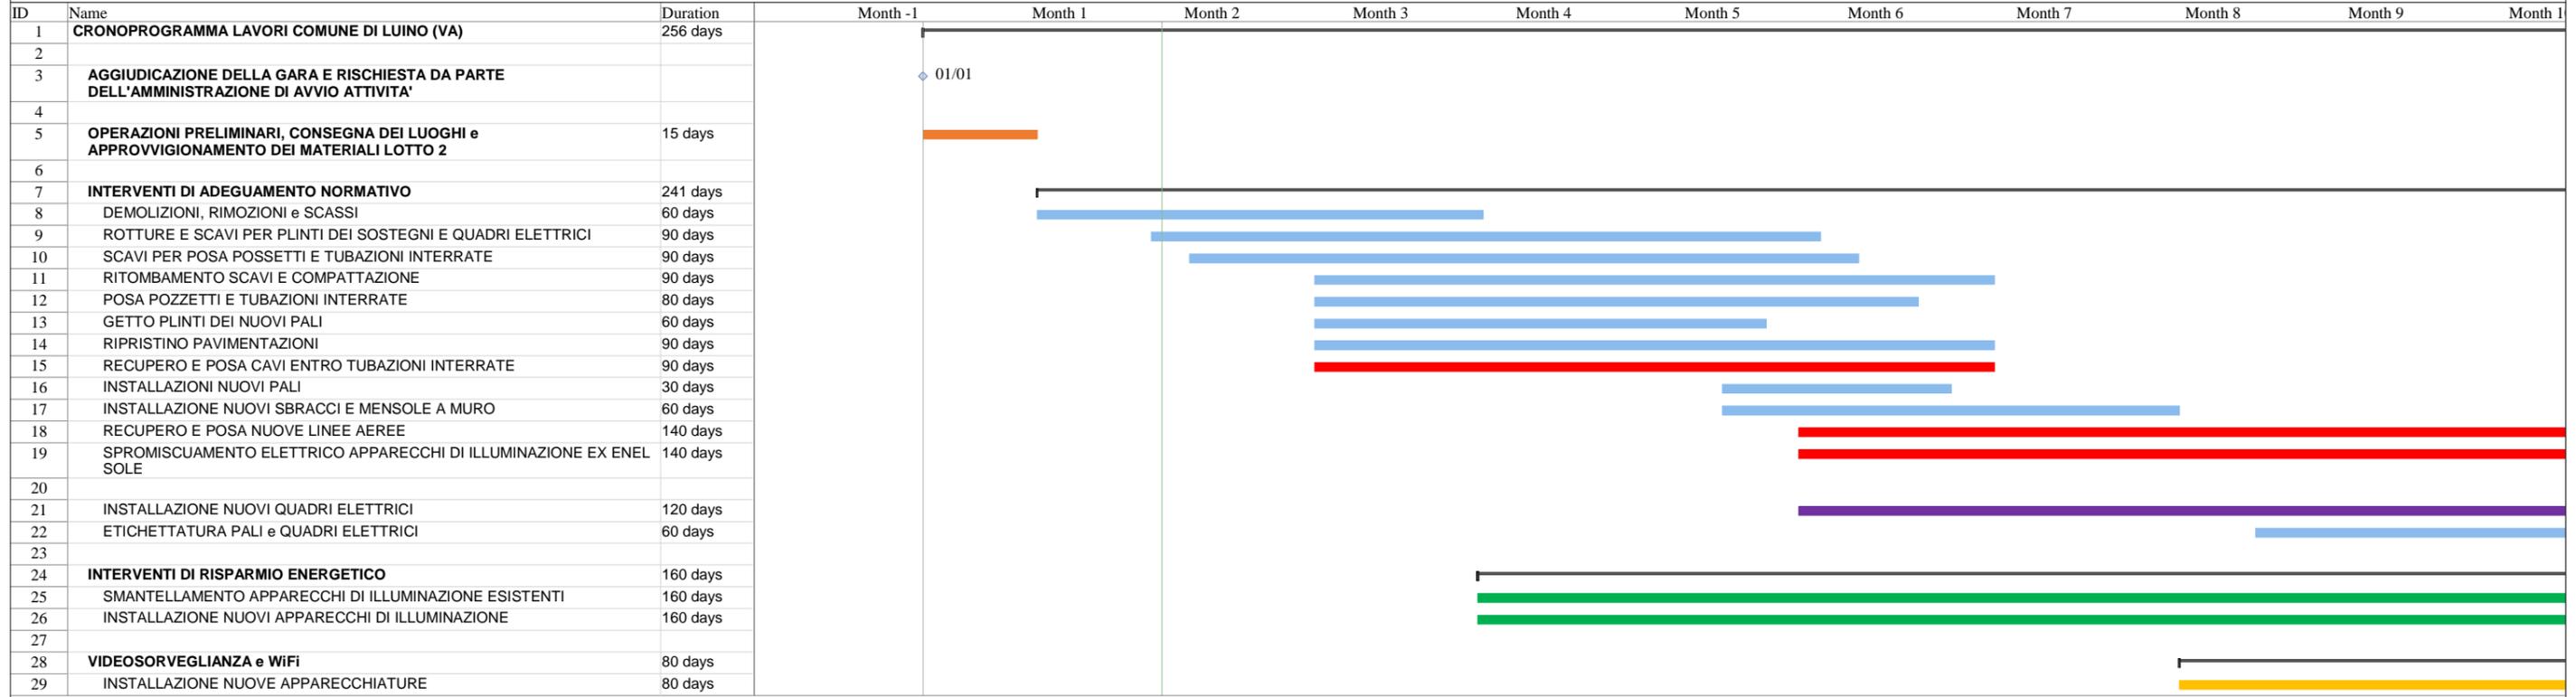

ID	Name	Duration	Month 10	Month 11	Month 12	Month 13	Month 14	Month 15	Month 16	Month 17	Month 18	Month 19	Month 20
1	<b>CRONOPROGRAMMA LAVORI COMUNE DI LUINO (VA)</b>	256 days	[Summary bar]										
2													
3	<b>AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E RISCHIESTA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DI AVVIO ATTIVITA'</b>												
4													
5	<b>OPERAZIONI PRELIMINARI, CONSEGNA DEI LUOGHI e APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI LOTTO 2</b>	15 days											
6													
7	<b>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO</b>	241 days	[Summary bar]										
8	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI e SCASSI	60 days											
9	ROTTURE E SCAVI PER PLINTI DEI SOSTEGNI E QUADRI ELETTRICI	90 days											
10	SCAVI PER POSA POSSETTI E TUBAZIONI INTERRATE	90 days											
11	RITOMBAMENTO SCAVI E COMPATTAZIONE	90 days											
12	POSA POZZETTI E TUBAZIONI INTERRATE	80 days											
13	GETTO PLINTI DEI NUOVI PALI	60 days											
14	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI	90 days											
15	RECUPERO E POSA CAVI ENTRO TUBAZIONI INTERRATE	90 days											
16	INSTALLAZIONI NUOVI PALI	30 days											
17	INSTALLAZIONE NUOVI SBRACCI E MENSOLE A MURO	60 days											
18	RECUPERO E POSA NUOVE LINEE AEREE	140 days	[Red bar]										
19	SPROMISCUAMENTO ELETTRICO APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE EX ENEL SOLE	140 days	[Red bar]										
20													
21	INSTALLAZIONE NUOVI QUADRI ELETTRICI	120 days	[Purple bar]										
22	ETICETTATURA PALI e QUADRI ELETTRICI	60 days	[Blue bar]										
23													
24	<b>INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO</b>	160 days	[Summary bar]										
25	SMANTELLAMENTO APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE ESISTENTI	160 days	[Green bar]										
26	INSTALLAZIONE NUOVI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE	160 days	[Green bar]										
27													
28	<b>VIDEOSORVEGLIANZA e WIFI</b>	80 days	[Summary bar]										
29	INSTALLAZIONE NUOVE APPARECCHIATURE	80 days	[Yellow bar]										
