

Progetto esecutivo e sicurezza in fase di progettazione



Comune di Telti

Provincia di Sassari

OGGETTO: Riqualficazione di Piazza Rinascita Comune di Telti

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Telti

ELABORATO - 17

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CUP: G64J24000440006

Telti, lì 8 Dicembre 2024


I Progettisti:

Arch. Pancrazio Paolo Azzena,


Ing. Stefania Placco



Pianif. Fabiana Frisanco

ID	Nome	Durata 289,00 g	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 - ONERI DELLA SICUREZZA													
2	PF.CART.PRINC.01 - Fornitura e posa in opera di cartello ...1729/UI del 01 giugno 1990, L=1m e H=2m	1,00												
3	SAR24_Pf.0014.0004.0003 - Monoblocco prefabbricato per bagni, co...3150x2400 mm con altezza pari a 2400 mm	1,00												
4	SAR24_Pf.0014.0006.0001 - Costo per l'esecuzione di riunioni di ...di lavoro, prezzo per ciascuna riunione	9,00												
5	SAR24_PR.0045.0005.0013 - Cartello indicatore conforme D.M. 17/0...previstecertificazioni ed omologazioni	1,00												
6	SAR24_Pf.0014.0001.0004 - Legname, fornito e posto in opera per ...a metro cubo di legname posto in opera.	0,00												
7	SAR24_Pf.0014.0001.0008 - Dispositivi di protezione individuale,... pari a 300 g costo di utilizzo mensile	1,00												
8	SAR24_Pf.0014.0001.0009 - Dispositivi di protezione individuale,...lizzo mensile: a) visiera con caschetto	1,00												
9	SAR24_Pf.0014.0001.0011 - Dispositivi di protezione individuale,...e antigraffio costo di utilizzo mensile	1,00												
10	SAR24_Pf.0014.0001.0013 - Dispositivi di protezione individuale,... pari a 25 dB costo di utilizzo mensile	1,00												
11	SAR24_Pf.0014.0001.0018 - Dispositivi di protezione individuale,...o, antiacido) costo di utilizzo mensile	1,00												
12	SAR24_Pf.0014.0002.0005 - Segnalazione di cantieri temporanei co...se: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I	1,00												
13	SAR24_Pf.0014.0002.0011 - Cartello di forma circolare, segnalant...se: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I	1,00												
14	SAR24_Pf.0014.0002.0029 - Dispositivo luminoso, ad integrazione ...alogeno, costo di utilizzo per un mese	1,00												
15	SAR24_Pf.0014.0002.0030 - Lampeggiatori sincronizzabili, da posi...llula: a) costo di utilizzo per un mese	1,00												
16	SAR24_Pf.0014.0003.0001 - Recinzione provvisoria realizzata con ...antire la sicurezza del luogo di lavoro	6,00												
17	SAR24_Pf.0014.0003.0003 - Cancelli in pannelli di lamiera zincat... in opera, per mese o frazione di mese.	1,00												
18	SAR24_Pf.0014.0005.0004 - Sorveglianza sanitaria svolta dal medi...l obbligo. Costo annuo per lavoratore.	0,00												
19	SAR24_Pf.0014.0005.0005 - Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo semestrale.	0,00												
20	2 - DEMOLIZIONI													
21	SAR24_Pf.0012.0015.0001 - Rimozione di opere in ferro lavorato q... in chilogrammi della struttura rimossa	2,00												
22	R.01 - Rimozione di panche in granito a mano ... in sito identificato dalla committenza	1,00												
23	SAR24_Pf.0001.0002.0044 - TRASPORTO a discarica e/o da cava...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	8,00												
24	R.02 - Rimozione di panche in metallo/legno a... in sito identificato dalla committenza	1,00												
25	R.03 - Rimozione di fioriere a mano e con l'a... in sito identificato dalla committenza	1,00												
26	SAR24_Pf.0005.0004.0011 - DEMOLIZIONE di muratura in pietrame, c...l materiale di recupero da riutilizzare	3,00												
27	SAR24_Pf.0005.0004.0014 - DEMOLIZIONE di struttura in calcestruz...d una altezza pari a m.-0.50 sul l.m.m.	3,00												
28	SAR24_Pf.0001.0001.0006 - DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI P...vimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO	3,00												
29	SAR24_Pf.0001.0001.0010 - DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI P...o a discarica controllata e autorizzata	3,00												
30	SAR24_Pf.0001.0002.0015 - SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o...ano di sbancamento o dall'orlo del cavo	43,00												
31	SAR24_Pf.0001.0009.0009 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	4,00												
32	SAR24_Pf.0001.0009.0005 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	4,00												
33	SAR24_Pf.0001.0009.0011 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	4,00												
34	SAR24_Pf.0001.0009.0013 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	4,00												
35	R.04 - Rimozione di pali per illuminazione pu... in sito identificato dalla committenza	1,00												
36	3 - OPERE EDILI													
37	3.1 - OPERE IN CEMENTO ARMATO E RIEMPIMENTI													
38	B.01 - FORNITURA DI PENETRON ADMIX Sistema ec...le avverrà secondo le tecniche standard	1,00												
39	SAR24_Pf.0008.0002.0008 - RETE ELETTROSALDATA costituita da barr...metro delle barre FI 5, maglia cm 20x20	5,00												
40	SAR24_PR.0005.0001.0003 - CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZ...2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	1,00												
41	SAR24_Pf.0008.0001.0004 - CASSEFORME in legname grezzo per getti...cle dei casseri a contatto con il getto	10,00												
42	SAR24_PR.0005.0002.0002 - CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABIL...di esposizione X0 norma UNI EN 206:2021	2,00												
43	SAR24_Pf.0008.0002.0002 - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN C... Con impiego di barre fino a FI 12-14	50,00												
44	SAR24_Pf.0008.0001.0001 - CASSEFORME in legname grezzo per getti...cle dei casseri a contatto con il getto	30,00												
45	SAR24_Pf.0001.0002.0038 - RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RIS...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere	7,00												
46	3.2 - FINITURE													
47	A01 - PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO I scelt...nale con lastre di granito GRIGIO PERLA	35,00												
48	A01.2 - PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO I scelt...inale con lastre di granito SAN GIACOMO	21,00												
49	A03 - Fornitura e posa in opera di panchina...er dare l'opera finita a regola d'arte.	2,00												
50	A04 - Fornitura e posa in opera di panchina...i dimensioni inferiori di circa il 57 %	2,00												
51	A05 - Fornitura e posa in opera di BORDI AIU...ezza punta' per uno sviluppo di 7,20 ml	6,00												
52	A06 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIME... dare il lavoro finito a regola d'arte.	25,00												
53	A07 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIME... dare il lavoro finito a regola d'arte.	22,00												
54	SAR24_Pf.0013.0004.0026 - INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETT...mento tipo R 32,5 per m³ 1.00 di sabbia	10,00												
55	SAR24_Pf.0013.0003.0104 - MURATURA CON PARAMENTO ESTERNO GREZZO...mento tipo R 32,5 per m³ 1.00 di sabbia	7,00												
56	4 - IMPIANTO ELETTRICO													
57	4.1 - QUADRO ELETTRICO													
58	SAR24_Pf.0009.0002.0022 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da...lusi gli apparecchi e le opere murarie.	1,00												
59	SAR24_Pf.0009.0003.0152 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSE...reso il cablaggio interno degli stessi.	5,00												
60	SAR24_Pf.0009.0003.0025 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSE...reso il cablaggio interno degli stessi.	5,00												
61	SAR24_Pf.0009.0007.0020 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interrutt...to del livello di soglia di luminosità.	5,00												
62	4.2 - DISTRIBUZIONE													
63	SAR24_Pf.0003.0015.0001 - POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo...sioni della copertina 40x40xHmin=4/5 cm	2,00												
64	SAR24_Pf.0009.0001.0018 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN P...infinchi ed al rinterro del caviddotto.	2,00												
65	SAR24_Pf.0009.0006.0041 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipo...rrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 2x6 mmq	2,00												
66	SAR24_Pf.0009.0001.0003 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isol...pere murarie in genere D esterno 25 mm.	2,00												
67	SAR24_Pf.0009.0006.0025 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipola...rata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x10 mmq	1,00												
68	SAR24_Pf.0009.0006.0038 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipo...ata. (rif. CEI 20-67) Sezione 2x1,5 mmq	1,00												
69	4.3 - PALI E APPARECCHI ILLUMINANTI													
70	FOR.REF.1746 - Fornitura e posa in opera di faretto p...S C4 modello XENA SURFACE O EQUIVALENTE	4,00												
71	E02 - Fornitura e posa in opera di FORNITURA...egola d'arte. TIPO LEDKIA O EQUIVALENTE	4,00												
72	E03 - FORNITURA E POSA IN OPERA di Faretto L...gola d'arte. TIPO LEDKIA O EQUIVALENTE.	4,00												
73	E04 - FORNITURA E POSA IN OPERA di faretto p...gola d'arte. TIPO LEDKIA O EQUIVALENTE.	4,00												
74	SAR24_PR.0049.0015.0010 - Plinto monoblocco in cemento...destinata... in opera ed esercizio della struttura.	2,00												
75	SAR24_PR.0049.0015.0011 - Plinto monoblocco in cemento...destinat... in opera ed esercizio della struttura	2,00												
76	Pf.PIC.TYPE IV.A - FORNITURA E POSA IN OPERA di palo per...or 4 m, 2 luci della NERI o EQUIVALENTE	3,00												
77	Pf.PIC.TYPE IV.A4 - FORNITURA E POSA IN OPERA di palo per...or 4 m, 1 luci della NERI o EQUIVALENTE	3,00												
78	Pf.PIC.TYPE IV.A5 - FORNITURA E POSA IN OPERA di palo per...or 5 m, 1 luci della NERI o EQUIVALENTE	3,00												
79	5 - AREA VERDE													
80	E05 - FORNITURA E POSA IN OPERA di proiettor...a regola d'arte. TIPO XYH O EQUIVALENTE	3,00												
81	SAR24_Pf.0001.0007.0010 - STRATI DI DRENAGGIO realizzati con mis...ale compresso con esecuzione a macchina	6,00												
82	SAR24_Pf.0001.0002.0011 - TERRA VEGETALE data in opera per rives...ipamento. Escluso il trasporto da cava.	5,00												
83	V04 - FORNITURA E POSA IN OPERA di prato ing...e garantire la corretta messa a dimora	4,00												
84	IMP.IRR.01 - FORNITURA E POSA IN OPERA di impianto...er dare l'opera finita a regola d'arte.	5,00												
85	SAR24_Pf.0006.0001.0029 - Fornitura e messa a dimora di arbusti...estrema aridità estiva o gelo invernale.	2,00												
86	SAR24_Pf.0006.0001.0028 - Fornitura e messa a dimora di alberi a...estrema aridità estiva o gelo invernale	2,00												
87	Pf.D23015 - Fornitura e posa in opera di vasca in...e la lavorazione finita a regola d'arte	3,00												
88	Pf.KIT.FON - FORNITURA E POSA IN OPERA DI impianto...one finita e perfettamente funzionante.	10,00												

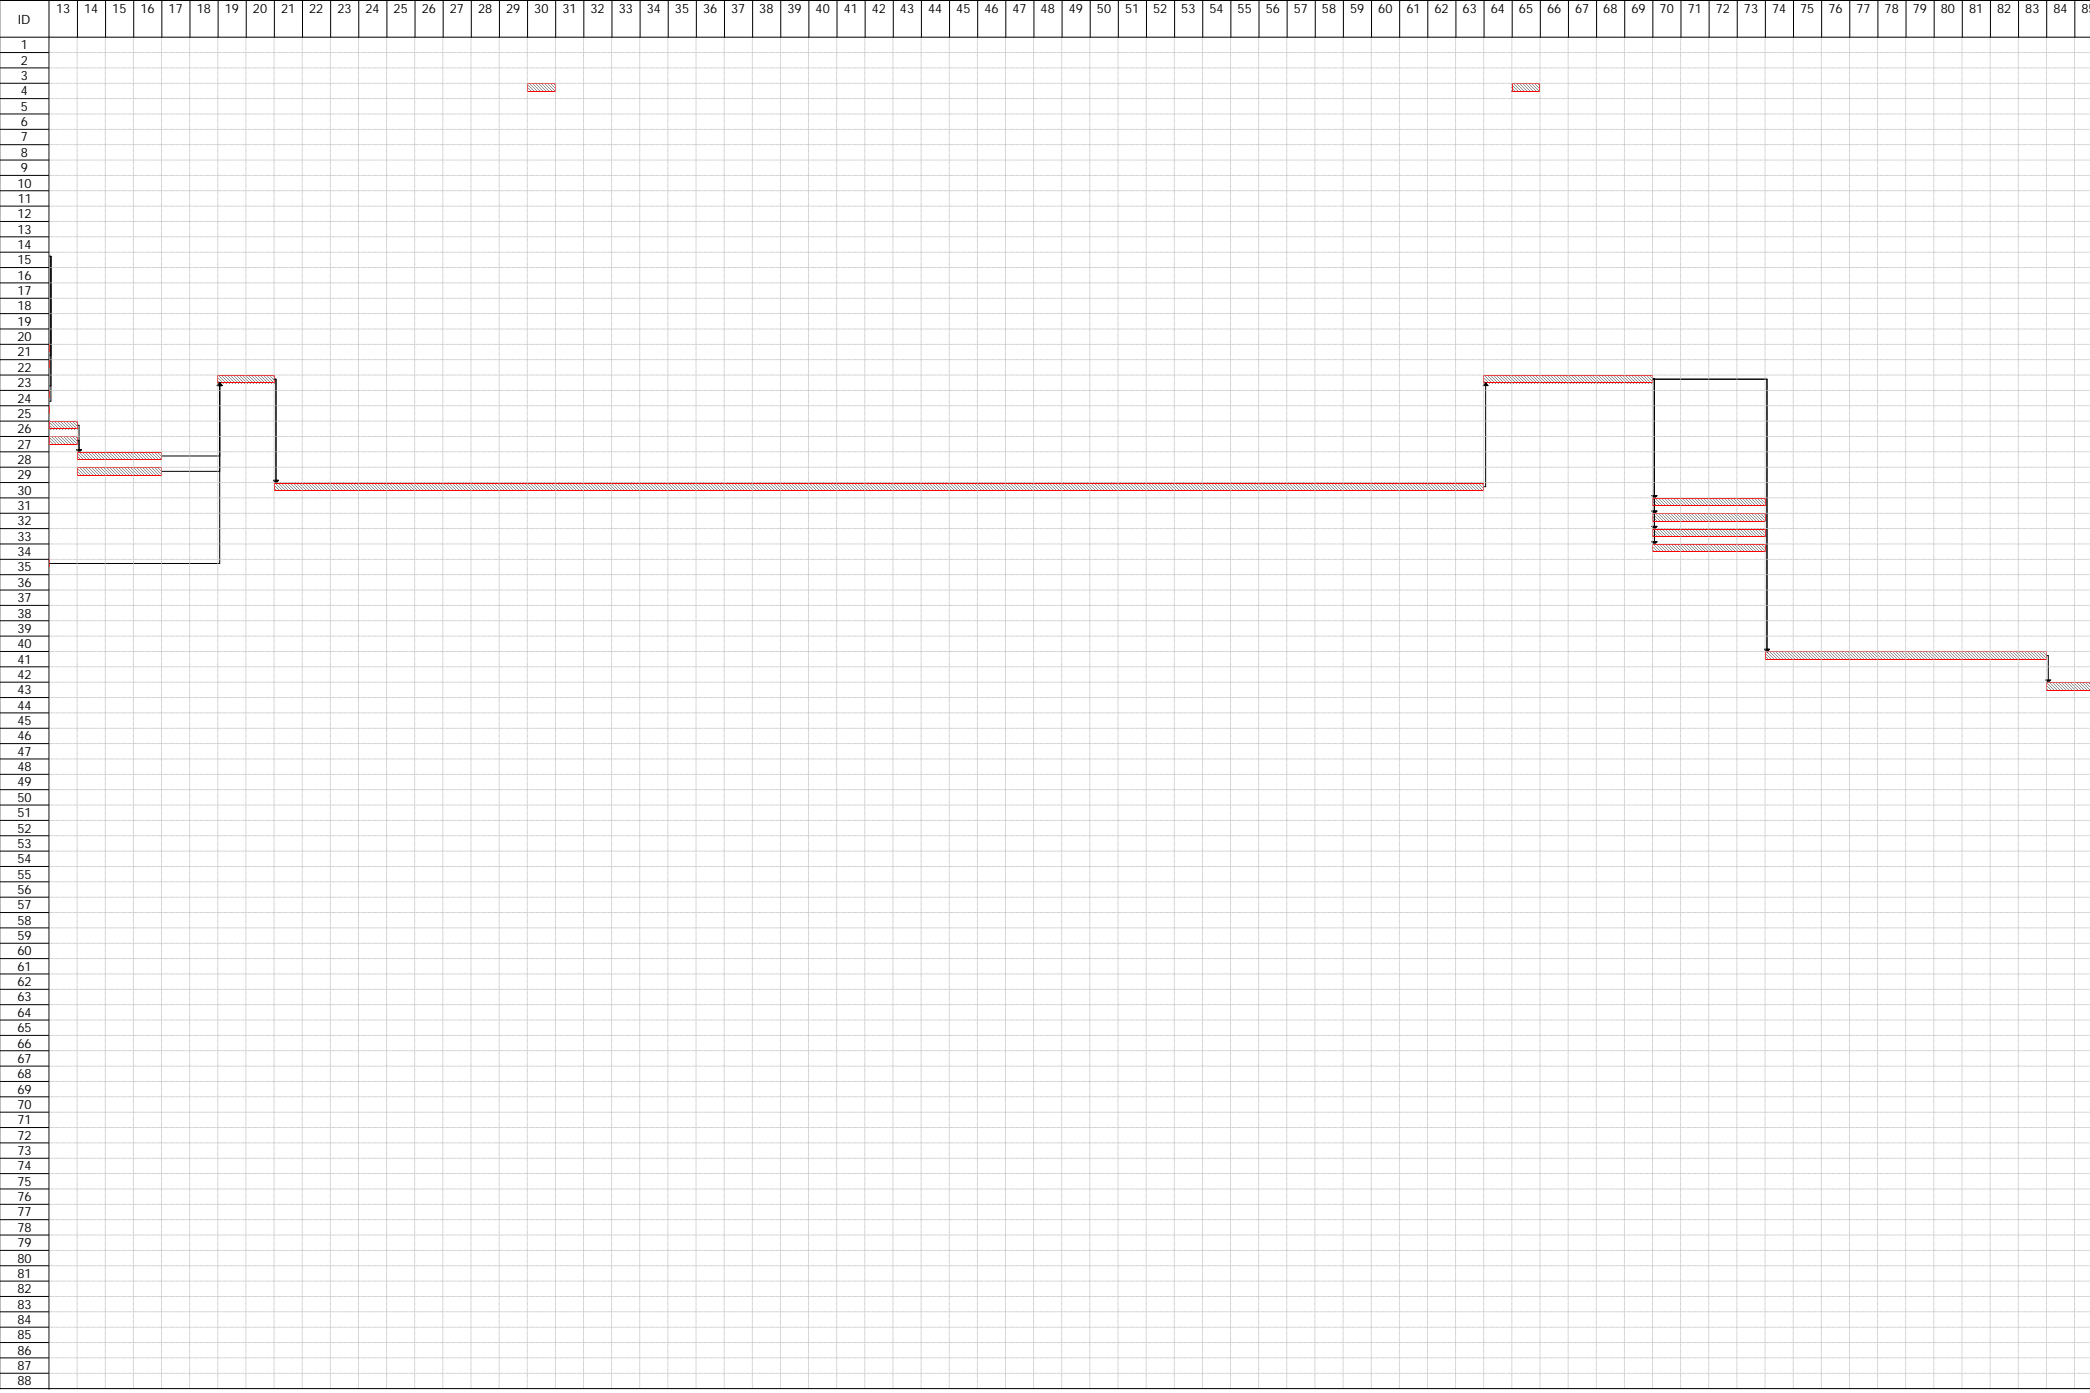

[illegible]

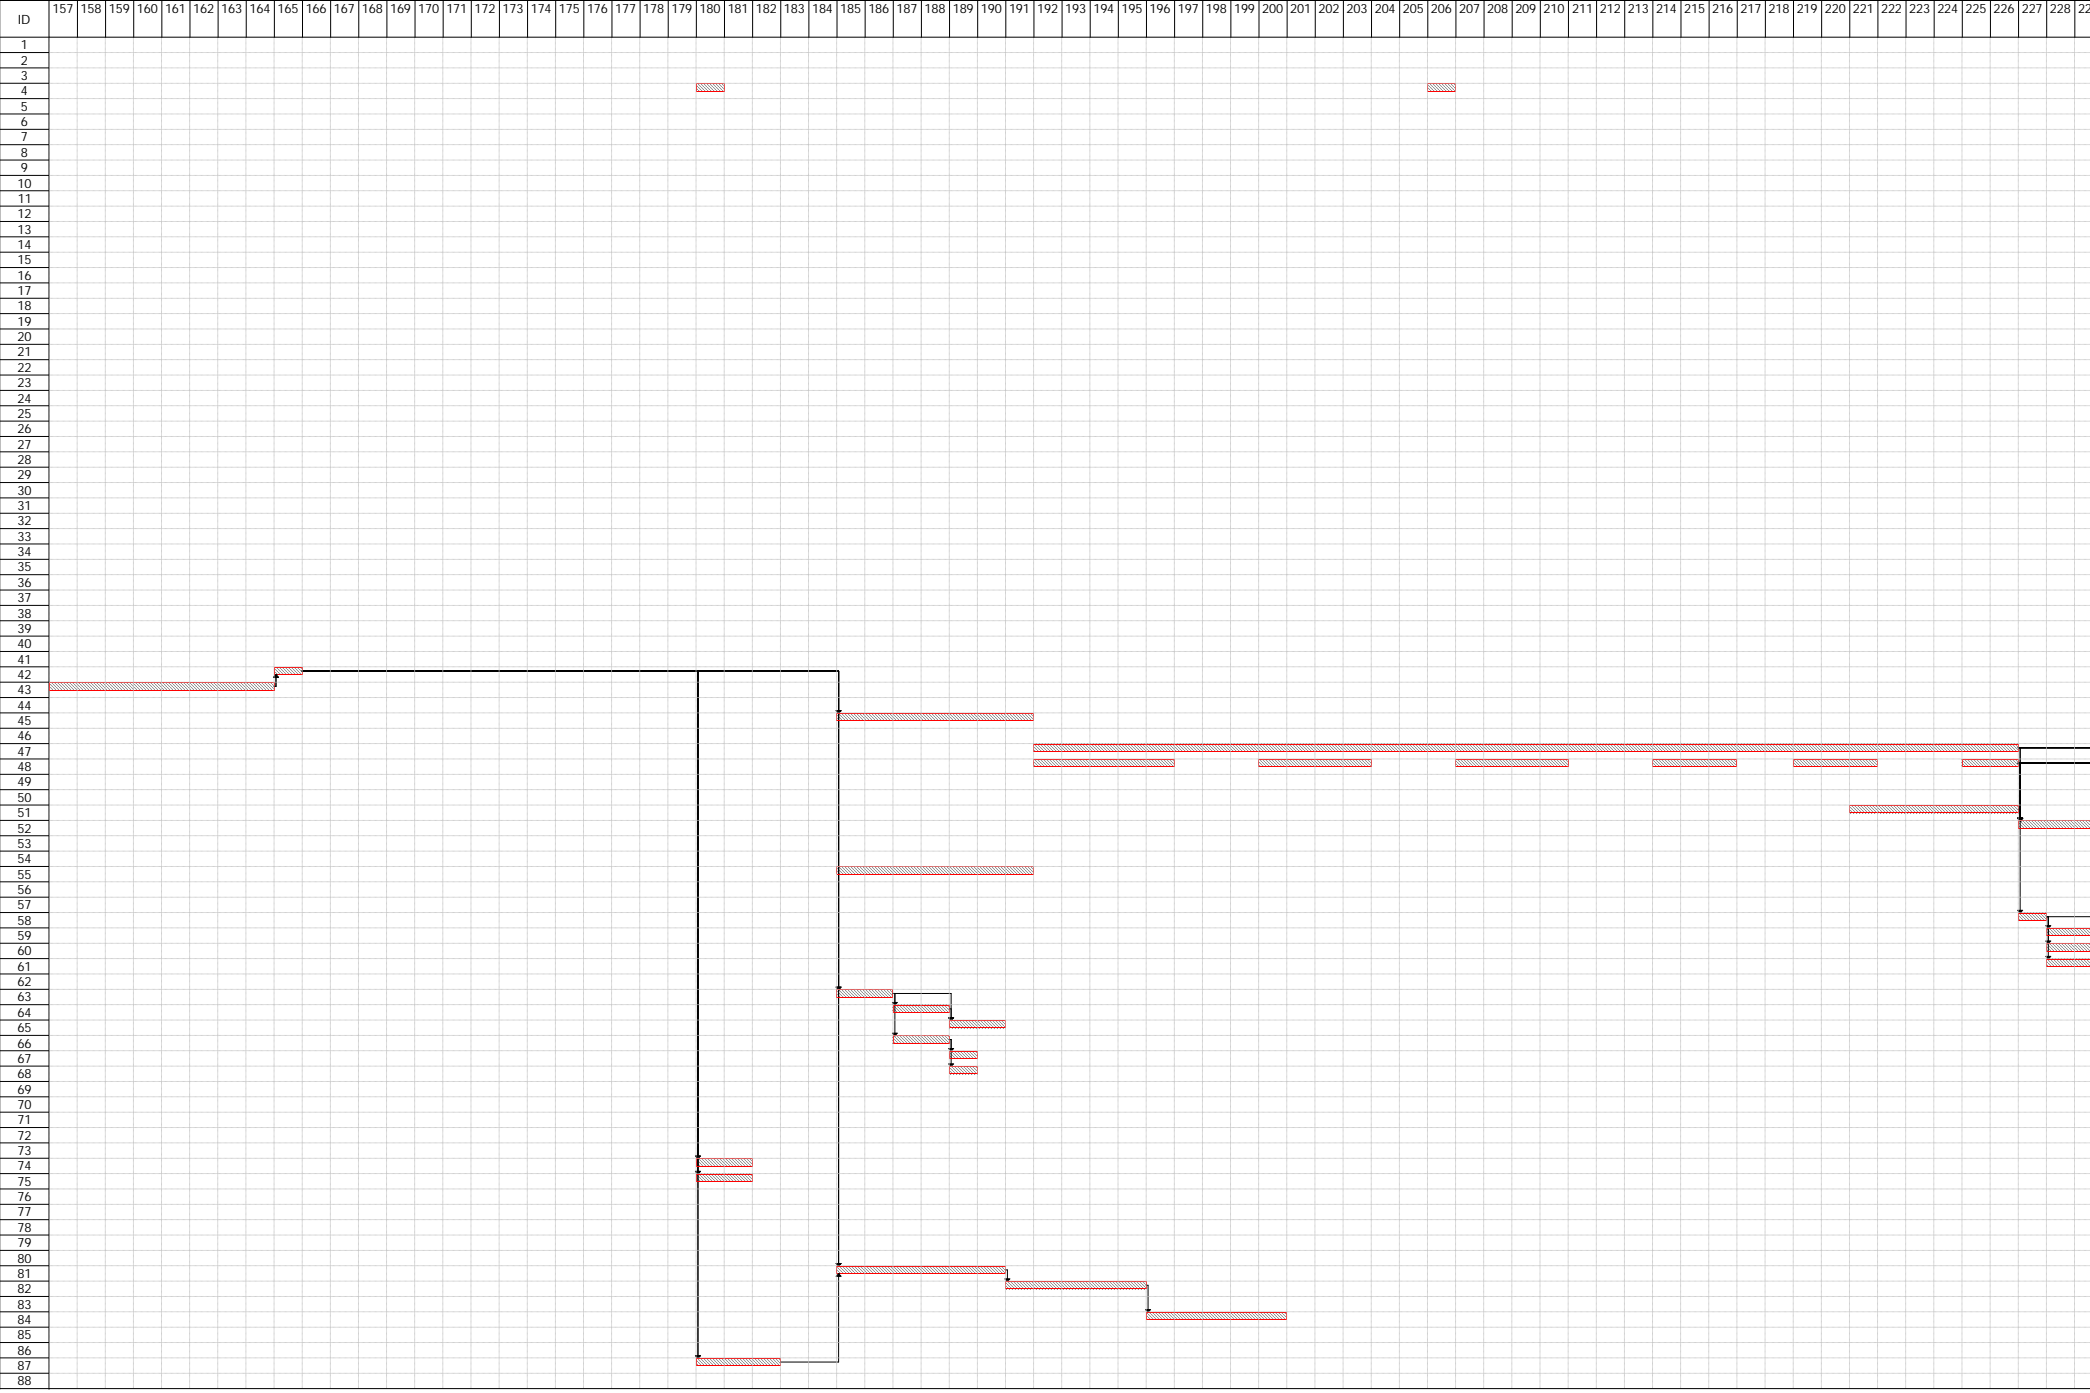

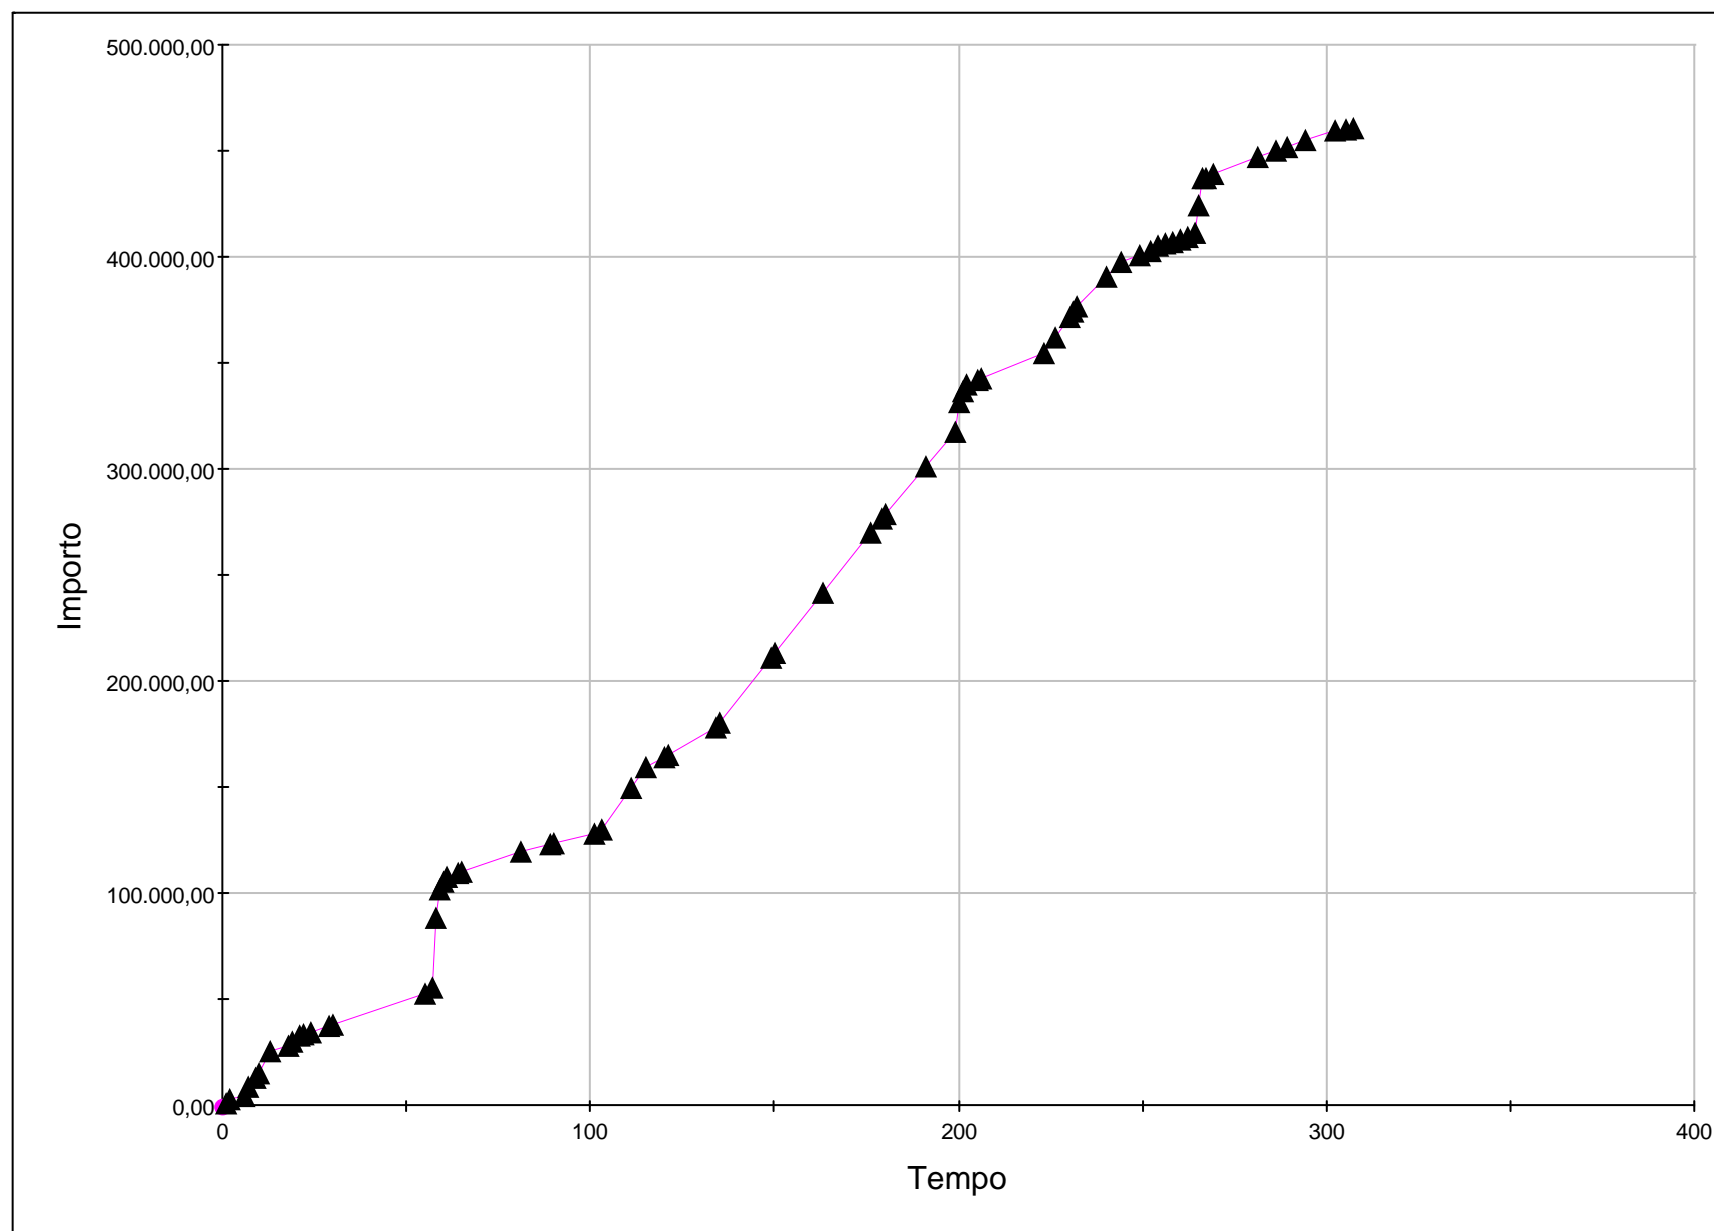

LEGENDA: ■ punto che delimita periodi a media di produzione costante
■ Stato Avanzamento Lavori programmato
