

Geom. Francesca ZANNI

Tecnico Competente in Pratiche Urbanistiche - Progettazione Edile 2D/3D - Rendering Fotorealistici - Progettazione e Certificazione Energetica degli Edifici - Direzione dei Lavori - Coordinatore Sicurezza Cantieri - Contabilità lavori - Pratiche Catastali - Stime e Perizie Tecniche - CTU/CTP



ELABORATI
PER LA SICUREZZA

Elab. nr.
C - 3.2

Via Costantino Patricio, 38
98030 Castelmola, Italia
cell +39 339 698 3373
francesca.zanni@pec.cloud
fzannigeometra@gmail.com
CF ZNNFNC01C57L042D
P. IVA 03734260833

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina



MESSA IN SICUREZZA STRADA INTERPODERALE GILETTO - LEONE E RIPRISTINO CORNICIONE SOMMITALE POLIAMBULATORIO - EVENTI 21-22 OTTOBRE 2024

D.D.G. n° 1533 del 30.12.2024

CUP: B55F25000540002

CIG: _____

PROGETTO ESECUTIVO

COD. PS. 2	OGGETTO: DIAGRAMMA DI GANTT - Cronoprogramma		Data: Marzo 2026
	Scala:	File: 14_C - 3.2 Diagramma di Gantt - cronoprogramma	Aggiornamenti:

PROGETTISTA:



II R.U.P.:

Visti:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

ALLEGATO "A"

Comune di SANT'ALESSIO SICULO
Provincia di Città Metropolitana di Messina

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA STRADA INTERPODERALE GILETTO – LEONE E
RIPRISTINO CORNICIONE SOMMITALE POLIAMBULATORIO – EVENTI 21-22
OTTOBRE 2024
D.D.G. n° 1533 del 30.12.2024

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO.

CANTIERE: SANT'ALESSIO SICULO (Città Metropolitana di Messina)

SANT'ALESSIO SICULO, 12/03/2026

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA



IL COMMITTENTE

(Responsabile Area Tecnica - Manutentiva Aliberti Domenico)

Geometra Zanni Francesca

Via C. Patricio, 38
98030 Castelmola (ME)
Tel.: 3396983373
E-Mail: fzannigeometra@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Tracciamento dell'area di cantiere	1	E	6	8	01/04/2026	08/04/2026
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	3	3	09/04/2026	11/04/2026
Realizzazione della viabilità di cantiere	1	E	1	1	11/04/2026	11/04/2026
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	5	5	09/04/2026	13/04/2026
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	09/04/2026	09/04/2026
Posa di segnaletica stradale temporanea	1	E	2	2	09/04/2026	10/04/2026
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1	E	10	18	13/04/2026	29/04/2026
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1	E	7	12	13/04/2026	23/04/2026
[O.D.] ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA	1	E	1	1	30/04/2026	30/04/2026
Formazione di fondazione stradale	1	E	10	14	30/04/2026	13/05/2026
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	7	11	30/04/2026	10/05/2026
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	7	11	30/04/2026	10/05/2026
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	7	11	30/04/2026	10/05/2026
Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	26/01/2026	26/01/2026
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	18/05/2026	18/05/2026
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	19/05/2026	19/05/2026
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	E	1	1	14/05/2026	14/05/2026
Realizzazione della recinzione di cantiere di ristrutturazione interna	1	E	2	2	20/05/2026	21/05/2026
Realizzazione degli accessi al cantiere di ristrutturazione interna	1	E	2	2	23/05/2026	24/05/2026
Formazione intonaci esterni tradizionali	1	E	7	9	23/06/2026	01/07/2026
Formazione intonaci esterni tradizionali	1	E	7	9	23/06/2026	01/07/2026
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	1	E	3	3	25/07/2026	27/07/2026
Rimozione di manto di copertura in tegole	1	E	3	3	25/07/2026	27/07/2026
[A.P. 1] Risanamento del solaio di copertura, mediante la sostituzione delle pignatte ammalorate o lesionate.	1	E	5	5	09/02/2026	13/02/2026
Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo	1	E	5	5	30/07/2026	03/08/2026
[SIC24_21.03.01.001] Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ... he per ogni m² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore	1	E	5	5	09/02/2026	13/02/2026
[SIC24_21.09.08] Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzat ... istero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.	1	E	5	5	06/08/2026	10/08/2026
[SIC24_21.09.09] Fornitura e posa in opera di rasante cementizio di color ... rattazzo di spugna in uno spessore compreso tra 3 e 30 mm.	1	E	5	5	06/08/2026	10/08/2026
[SIC24_26.01.29] Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200 ... Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.	1	E	31	49	01/04/2026	17/05/2026
[SIC24_26.03.01.001] Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro ... era o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60	1	E	60	90	01/04/2025	01/07/2026
[SIC24_26.03.02.002] Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico ret ... ffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00	1	E	60	90	01/04/2025	01/07/2026
[SIC24_26.03.04] Lampeggiante da cantiere a led di colore gi ... lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	1	E	31	49	01/04/2025	17/05/2026
[SIC24_26.06.01] Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validit ...	1	E	60	90	01/04/2025	01/07/2026

Tabella Analitica Gantt

erferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.						
[SIC24_26.06.02] Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavo ... erferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	1	E	31	49	01/04/2026	01/07/2026
[SIC24_26.06.05] Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 1 ... erferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	1	E	60	90	01/04/2026	01/07/2026
[SIC24_26.06.14] Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di ... erferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	1	E	60	90	01/04/2026	01/07/2026
[SIC24_26.07.01.001] Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato ... ta. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego	1	E	60	90	01/04/2026	01/07/2026
[SIC24_26.08.32] NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI LAVABO conforme alla ... ne. Compreso i formulari per il trasporto e smaltimento.	1	E	31	49	01/04/2026	17/05/2026

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) =


E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Settimana 1						Settimana 2						Settimana 3						Settimana 4						Settimana 5										
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
Tracciamento dell'area di cantiere	6 g		Z1							6																										
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g							Z1	3																											
Realizzazione della viabilità di cantiere	1 g									Z1	1																									
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	5 g							Z1	5																											
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli	1 g							Z1	1																											
Posa di segnaletica stradale temporanea	2 g							Z1	2																											
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	10 g													Z1	10																					
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	7 g													Z1	7																					
[O.D.] ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA	1 g																																			
Formazione di fondazione stradale	10 g																																			
Formazione di manto di usura e collegamento	7 g																																			
Formazione di manto di usura e collegamento	7 g																																			
Formazione di manto di usura e collegamento	7 g																																			
Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e pe	1 g																																			
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g																																			
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1 g																																			
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1 g																																			
Realizzazione della recinzione di cantiere di ristrutturazione interna	2 g																																			
Realizzazione degli accessi al cantiere di ristrutturazione interna	2 g																																			
Formazione intonaci esterni tradizionali	7 g																																			
Formazione intonaci esterni tradizionali	7 g																																			
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	3 g																																			
Rimozione di manto di copertura in tegole	3 g																																			
[A.P. 1] Risanamento del solaio di copertura, mediante la sostituzior	5 g																																			
Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo	5 g																																			
[SIC24_21.03.01.001] Risanamento di strutture intelaiate in cement	5 g																																			
[SIC24_21.09.08] Fornitura e collocazione di rete porta intonaco rea	5 g																																			
[SIC24_21.09.09] Fornitura e posa in opera di rasante cementizio c	5 g																																			
[SIC24_26.01.29] Recinzione provvisionale modulare da cantiere al	31 g		Z1											31																						
[SIC24_26.03.01.001] Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogc	60 g		Z1											60																						
[SIC24_26.03.02.002] Segnaletica da cantiere edile, in materiale pl	60 g		Z1											60																						
[SIC24_26.03.04] Lampeggiante da cantiere a led di colore	31 g		Z1											31																						
[SIC24_26.06.01] Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità €	60 g		Z1											60																						
[SIC24_26.06.02] Occhiali protettivi con marchio di conformità per l	31 g		Z1											31																						
[SIC24_26.06.05] Maschera di protezione contro le polveri a norma	60 g		Z1											60																						

[illegible]

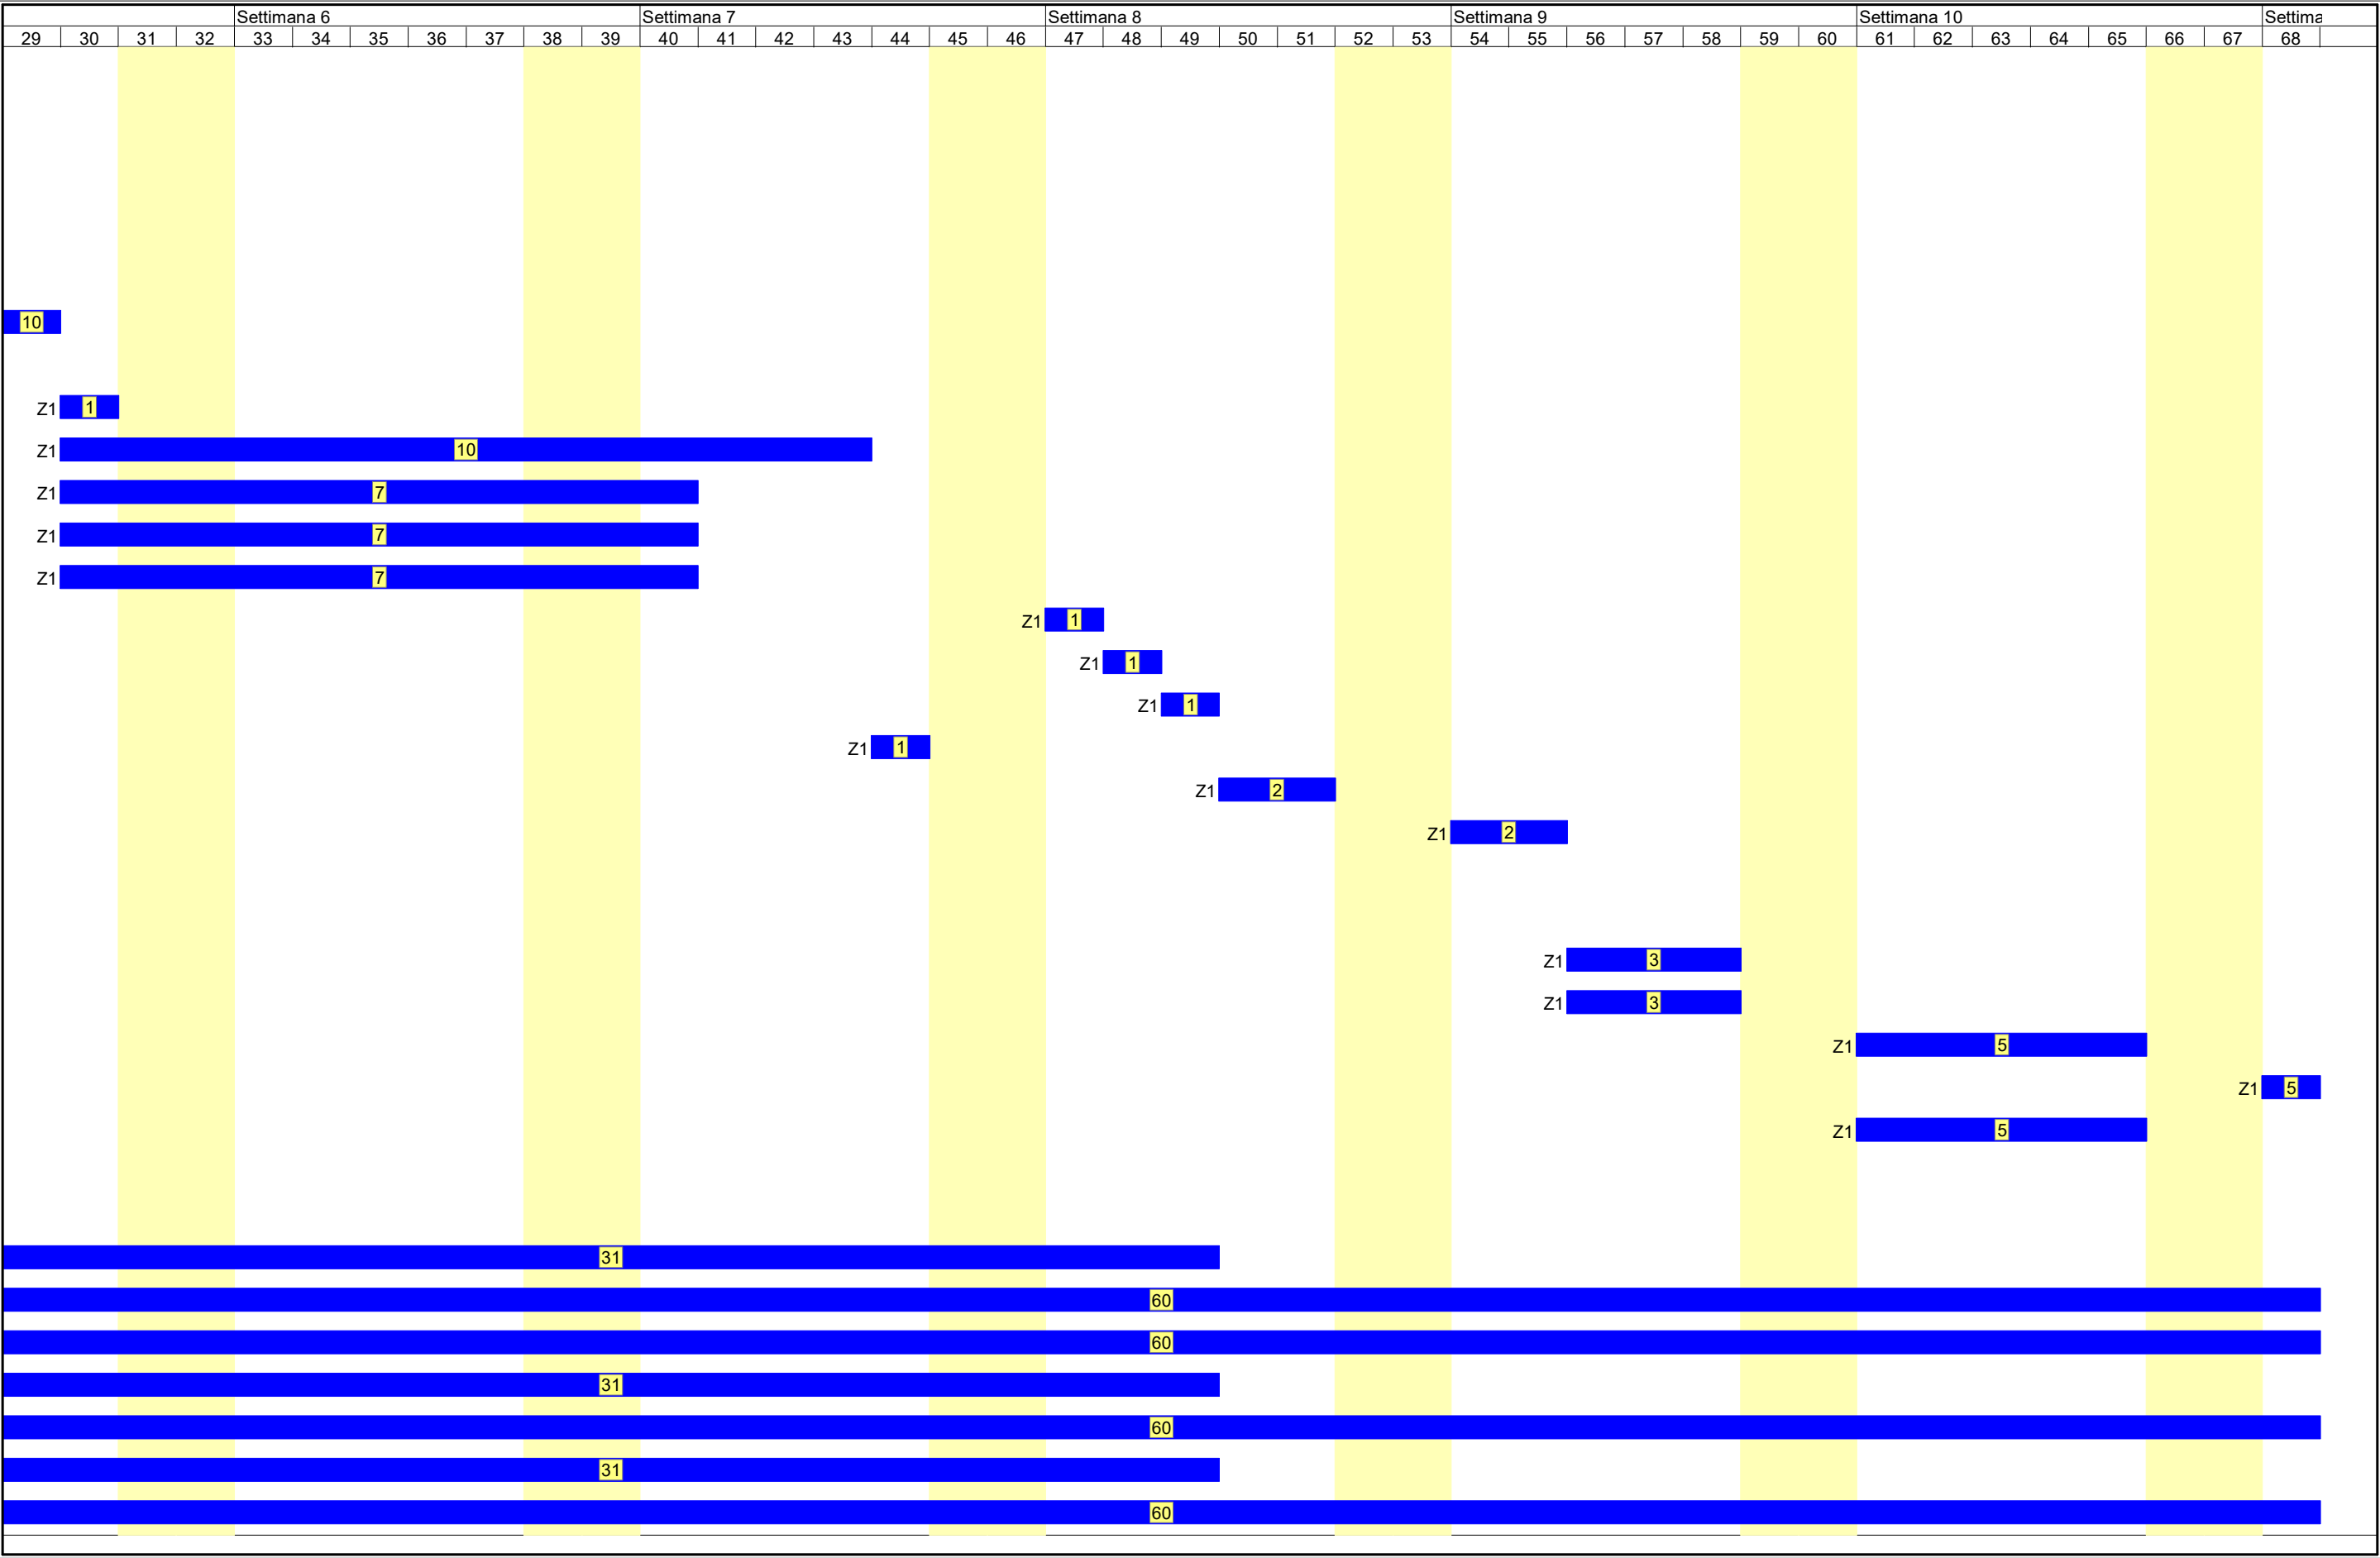

				Settimana 6						Settimana 7						Settimana 8						Settimana 9						Settimana 10						Settimana 11															
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69									

Settimana 11						Settimana 12						Settimana 13						Settimana 14						Settimana 15						Settimana 16											
69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108		
												60																													
												60																													
