


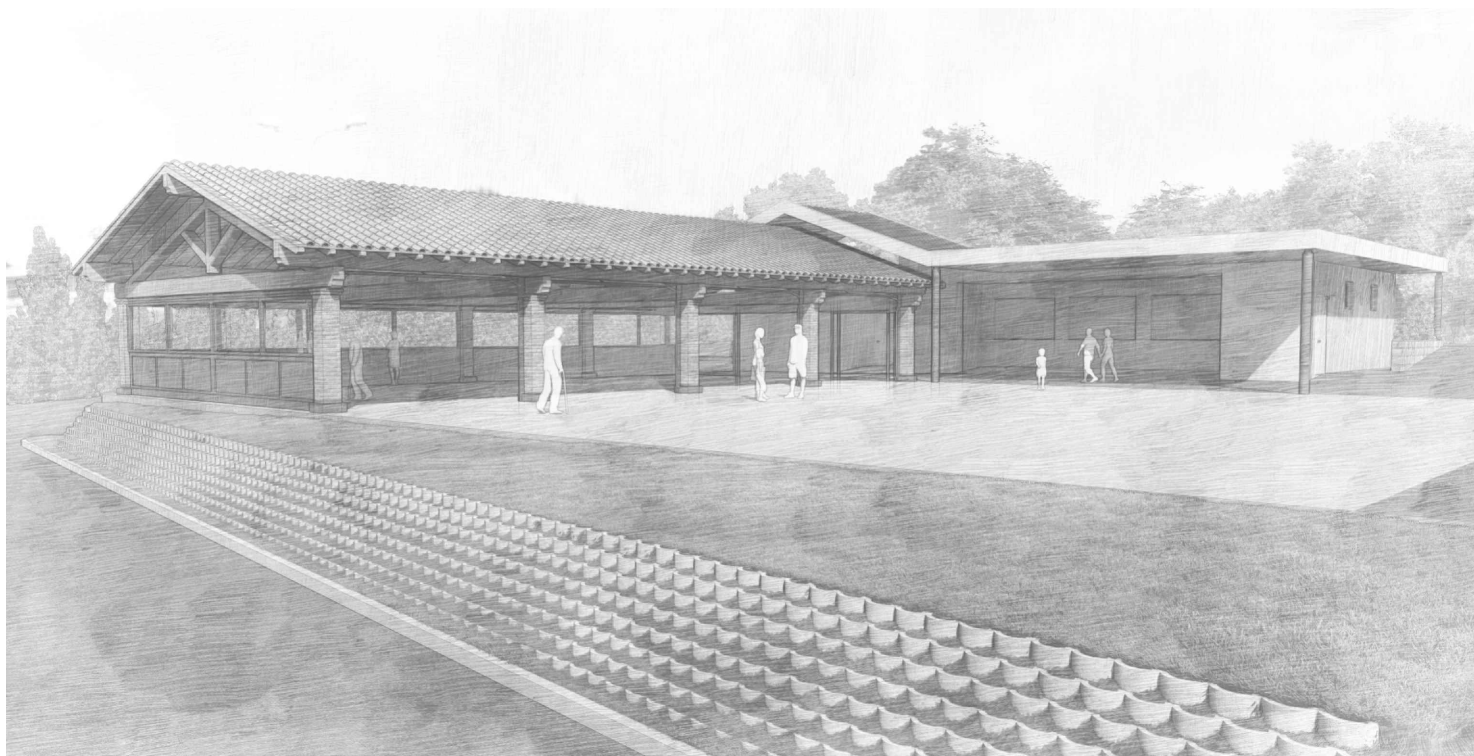

RIQUALIFICAZIONE AREA FESTE PIAZZALE EUROPA LOTTO 1 - COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO

PROGETTISTA

ARCHICOMO ENGINEERING SRL
VIA GIACOMO LEOPARDI, 35
22070 - GRANDATE (CO)

COMMITTENTE

COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO
PIAZZA DELLA PIEVE N.1, 22029
UGGIATE CON RONAGO (CO)



INTERVENTO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL' AREA FESTE DEL PIAZZALE EUROPA - LOTTO I - CHIUSURA
PADIGLIONE REFETTORIO - PIAZZA DELLA PIEVE 1 - 22029 UGGIATE CON RONAGO (CO)

PROGETTO ESECUTIVO (Art. 41 c. 8 del D.Lgs. n. 36/2023)

TITOLO:

DIAGRAMMA GANTT

NOME DEL FILE:

AC_UGG-PE_ESE_SIC_GANT.DWG

SCALA:

-

DATA:

OTTOBRE 2025

GANT

ALLEGATO "A"

Comune di Uggiate con Ronago
Provincia di CO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL' AREA FESTE DEL PIAZZALE EUROPA -
LOTTO I - CHIUSURA PADIGLIONE REFETTORIO - PIAZZA DELLA PIEVE 1 -
22029 UGGIATE CON RONAGO (CO)

COMMITTENTE: Comune di Uggiate con Ronago.

CANTIERE: Piazzale Europa, Uggiate con Ronago (CO)

DURATA LAVORI: 40 giorni

Como, 03/03/2025

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Martorana Gianmarco)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile Area Tecnica Ferrari Stefano)

Architetto Martorana Gianmarco

Via Stoppa, 32
22042 San Fermo della Battaglia (CO)
Tel.: 3474980793 - Fax: --
E-Mail: gianmarco.martorana@archicomo.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	gg L	gg C
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE			
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	2	2
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	2	2
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	1	1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	2	2
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro	1	2	2
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SCAVI			
Taglio di solai in c.a.	1	3	5
NUOVE OPERE			
Realizzazione di contropareti	1	5	7
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	4	4
Tinteggiatura di superfici interne	1	3	5
Formazione intonaci esterni tradizionali	1	3	3
Tinteggiatura di superfici esterne	1	3	5
Montaggio di serramenti esterni	1	4	4
Montaggio di porte sezionali	1	5	7
SMOBILIZZO DEL CANTIERE			
Smobilizzo del cantiere	1	2	2
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	1	1
LEGENDA: Z = ZONA Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori: 1) = ZONA UNICA gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro			

