

TELERISCALDAMENTO DI GALLIATE

CRONOPROGRAMMA AVANZAMENTO LAVORI STRADALI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO – FASE FINALE

				Luglio 2026											Agosto 2026																							
tratti	descrizione del tratto	Lunghezza (m)	Larghezza cantiere (m)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A	Da via Ticino fino all'inizio del vialetto interno alberato di viale Da Vinci	70	5	(1)																																		
B	attraversamento viale Da Vinci per raggiungere l'inizio di via Murciano	14	5																																			
C	via Murciano	93	5																																			
D	tratto carrabile in p.zza V. Veneto, fino all'inizio di via Bianca di Caravaggio	89	5																																			
E-F	tratto pedonale in porfido in p.zza V. Veneto costeggiando la canonica, la Chiesa, il Campanile Parrocchiale e la Polizia Locale	86	5																																			

note:

(1) l'azienda del gas deve lavorare in urgenza proprio all'inizio di viale Da Vinci il giorno lunedì 20 luglio, e tale attività è incompatibile con i nostri lavori

(2) Il venerdì 7 agosto in via Bianca di Caravaggio c'è il mercato bio agricolo, quindi potrebbe non essere possibile scavare nella parte finale del tratto D

Data: 15/07/2026

IL TECNICO



TRATTO A



Diametro esterno tubazioni interrato preisolate: 2 x 163 mm
Larghezza scavo/ripristino: 70 cm
Profondità scavo: 80 cm
Tipo di pavimentazione ripristinata: asfalto

TRATTO B



Diametro esterno tubazioni interrato preisolate: 2 x 163 mm
Larghezza scavo/ripristino: 70 cm
Profondità scavo: 80 cm
Tipo di pavimentazione ripristinata: asfalto

TRATTO C




Diametro esterno tubazioni interrante preisolate: 2 x 163 mm

Larghezza scavo/ripristino: 70 cm

Profondità scavo: 80 cm

Tipo di pavimentazione ripristinata: ripristino provvisorio in asfalto; ripristino definitivo in porfido su letto di sabbia o cemento (ripristino della pavimentazione come pre esistente)

TRATTO D

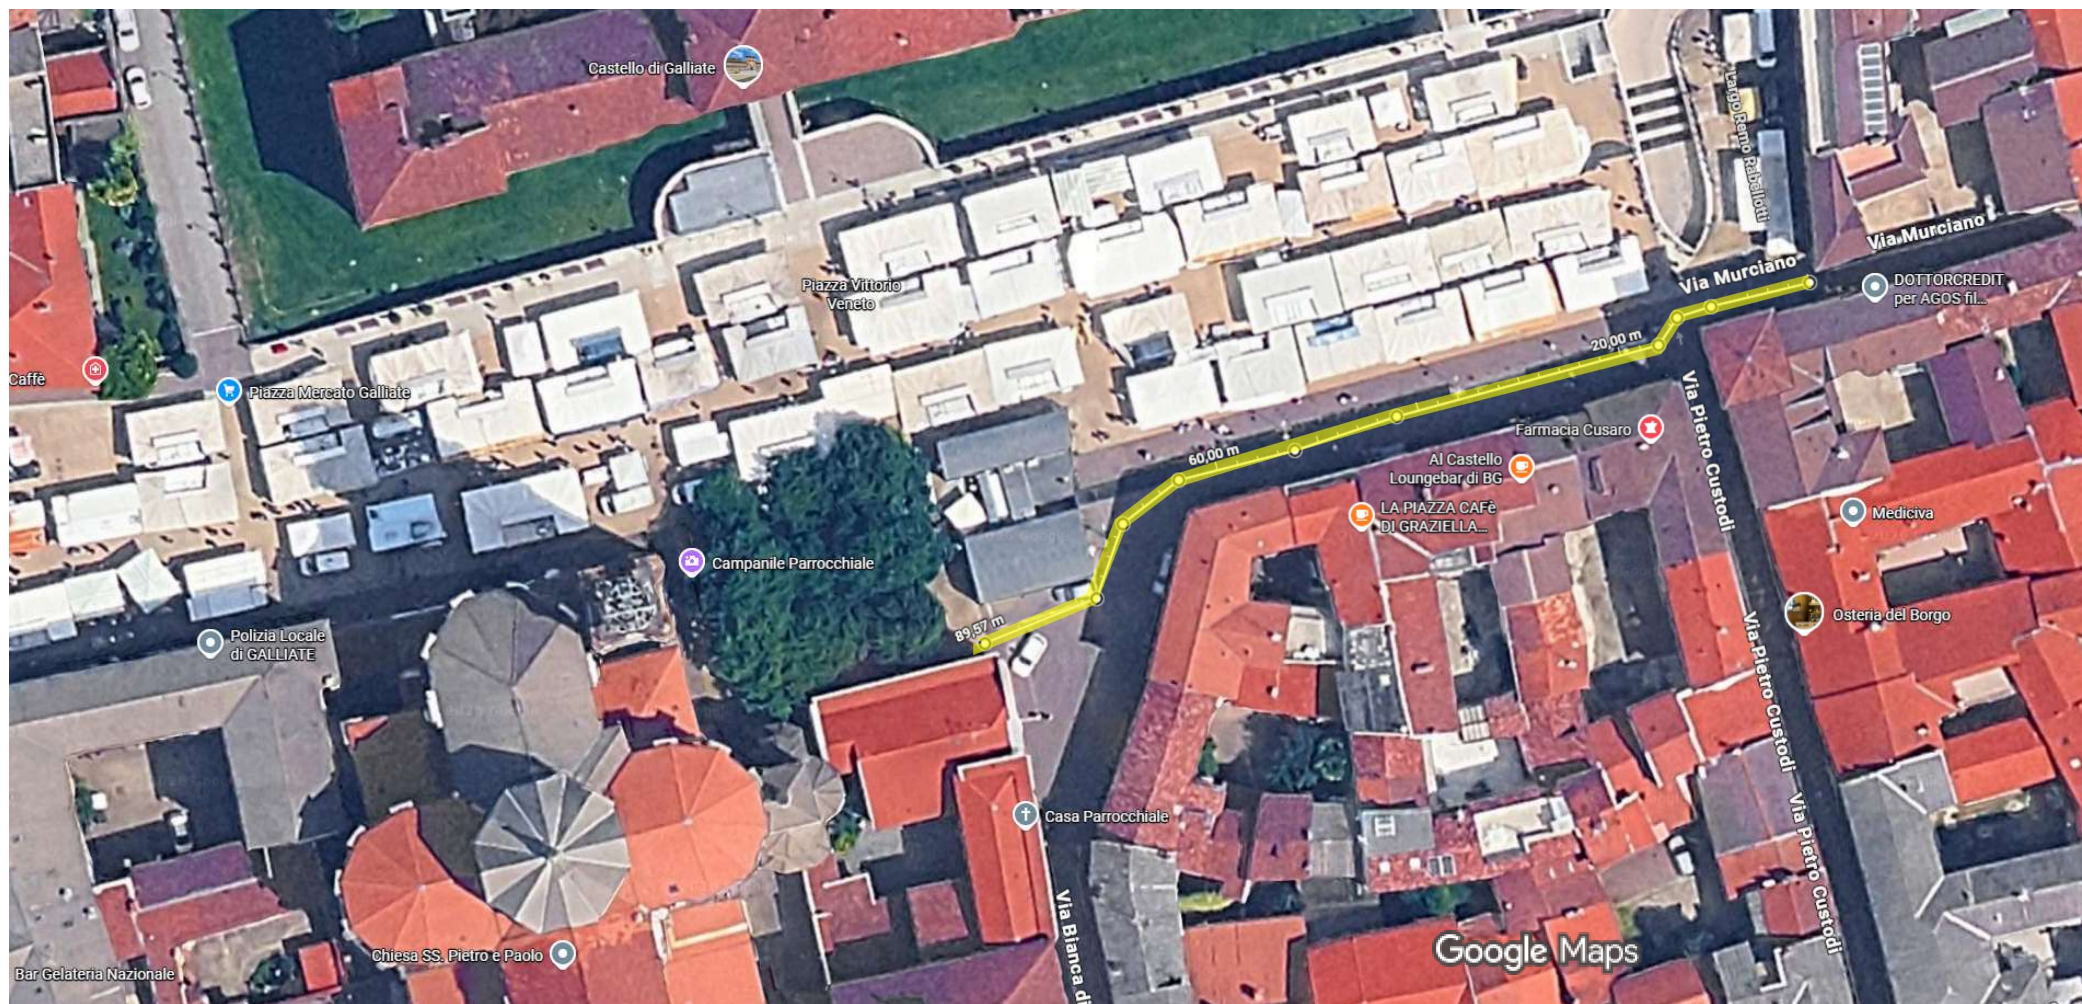

Diametro esterno tubazioni interrato preisolate: 2 x 163 mm

Larghezza scavo/ripristino: 70 cm

Profondità scavo: 80 cm

Tipo di pavimentazione ripristinata: ripristino provvisorio in asfalto; ripristino definitivo in porfido su letto di sabbia o cemento (ripristino della pavimentazione come pre esistente)

TRATTO E




Diametro esterno tubazioni interrante preisolate: 2 x 163 mm

Larghezza scavo/ripristino: 70 cm

Profondità scavo: 80 cm

Tipo di pavimentazione ripristinata: ripristino provvisorio in asfalto; ripristino definitivo in porfido su letto di sabbia o cemento (ripristino della pavimentazione come pre esistente)

TRATTO F

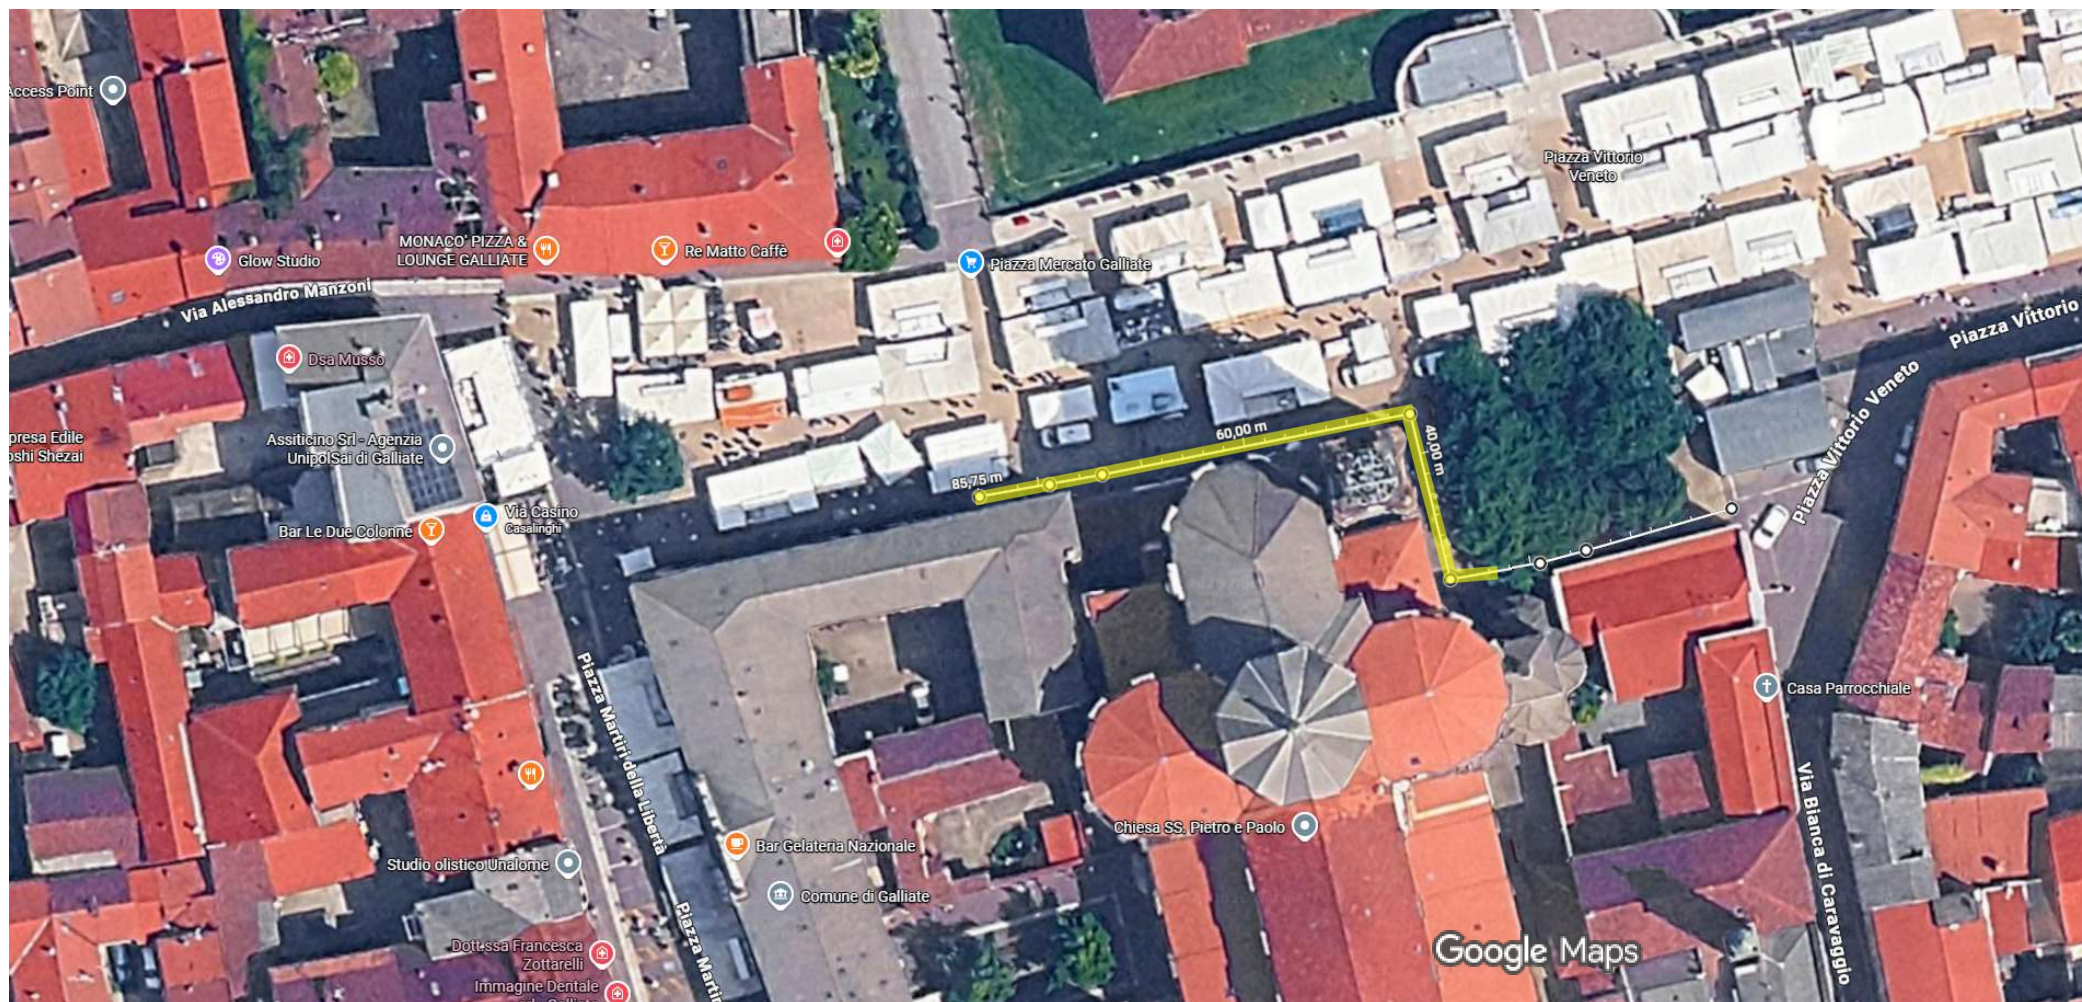

Diametro esterno tubazioni interrato preisolate: 2 x 128 mm

Larghezza scavo/ripristino: 60 cm

Profondità scavo: 75 cm

Tipo di pavimentazione ripristinata: ripristino provvisorio in asfalto; ripristino definitivo in porfido su letto di sabbia o cemento (ripristino della pavimentazione come pre esistente)
