Comune di Cepagatti

Provincia di Pescara
Via Raffaello D'Ortenzio 4 - P.IVA 00221110687
tel. 085-97401 - fax. 085-974100
Servizio 8 - Lavori Pubblici

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU


LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA DI VALLEMARE"

PROGETTO ESECUTIVO

Codice Elaborato:

R. 17

CRONOPROGRAMMA

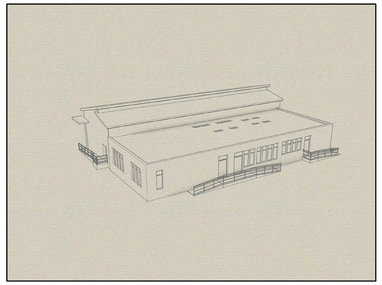

Data : Febbraio 2023

C.U.P.
J39F18000800001

Ing. Pamela Giancola

Iscritta all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al n. 1777

email :
ing.giancola@gmail.com
PEC :
pamela.giancola@ingpec.eu
P.IVA 01836850675

Committente :

RUP - Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta Carbone

Progettista :

Ing. Pamela Giancola

Nome attività	Durata
ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE	3 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di	1 g
Demolizione	5 g
Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi mecc	5 g
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici	5 g
Demolizione di strutture in acciaio con mezzi meccanici	5 g
Scavi	2 g
Scavo di sbancamento in terreni incoerenti	2 g
Lavori strutturali	49 g
fondazione	27 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fo	15 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g
Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica	7 g
Posa di reti elettrosaldate	1 g
Getto in calcestruzzo	1 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	2 g
Ponteggio	7 g
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	7 g
Elevazione	15 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in el	14 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1 g
Interventi edificio in muratura	26 g
Realizzazione di murature in mattoni	5 g
Consolidamento di muratura con applicazione di rete elettrosa	15 g
Montaggio di grossa orditura in ferro per solaio a tavelloni	5 g
Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in ferro e ta	1 g
Coperture in legno lamellare	23 g
Montaggio travi in legno lamellare	14 g
Montaggio di tavolame in legno lamellare	14 g
Posa di lucernario	5 g
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzonta	4 g
Impermeabilizzazioni	12 g
Impermeabilizzazione di coperture	5 g
Formazione di massetto per coperture	2 g
Impermeabilizzazione di coperture	5 g
Tamponature	15 g
Realizzazione di tamponature	15 g
Realizzazione di tramezzature interne	15 g
Isolamenti termici e acustici	15 g
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	15 g
Intonaci e pitturazioni in facciata	15 g
Formazione intonaci esterni	10 g
Tinteggiatura di superfici esterne	5 g
Opere di lattoneria	5 g
Realizzazione di opere di lattoneria	5 g
Impianti idrico-sanitario e del gas	15 g
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sani	10 g
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	5 g
Impianti elettrico	12 g
Realizzazione di impianto di messa a terra	1 g
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atm	1 g
Realizzazione di impianto elettrico	10 g
Impianti termici	10 g
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impian	10 g
Massetti e sottofondi	5 g
Formazione di massetto per pavimenti interni	5 g
Intonaci e pitturazioni interne	15 g
Formazione intonaci interni	10 g
Tinteggiatura di superfici interne	5 g
Serramenti	10 g
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo	7 g
Montaggio di serramenti esterni	7 g
Montaggio di porte interne	2 g
Montaggio di porte per esterni	1 g
Rivestimenti interni	13 g
Posa di pavimenti per interni in ceramica	4 g
Posa di rivestimenti interni in ceramica	2 g
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche	7 g
Smobilizzo del cantiere	2 g
Smobilizzo del cantiere	2 g

